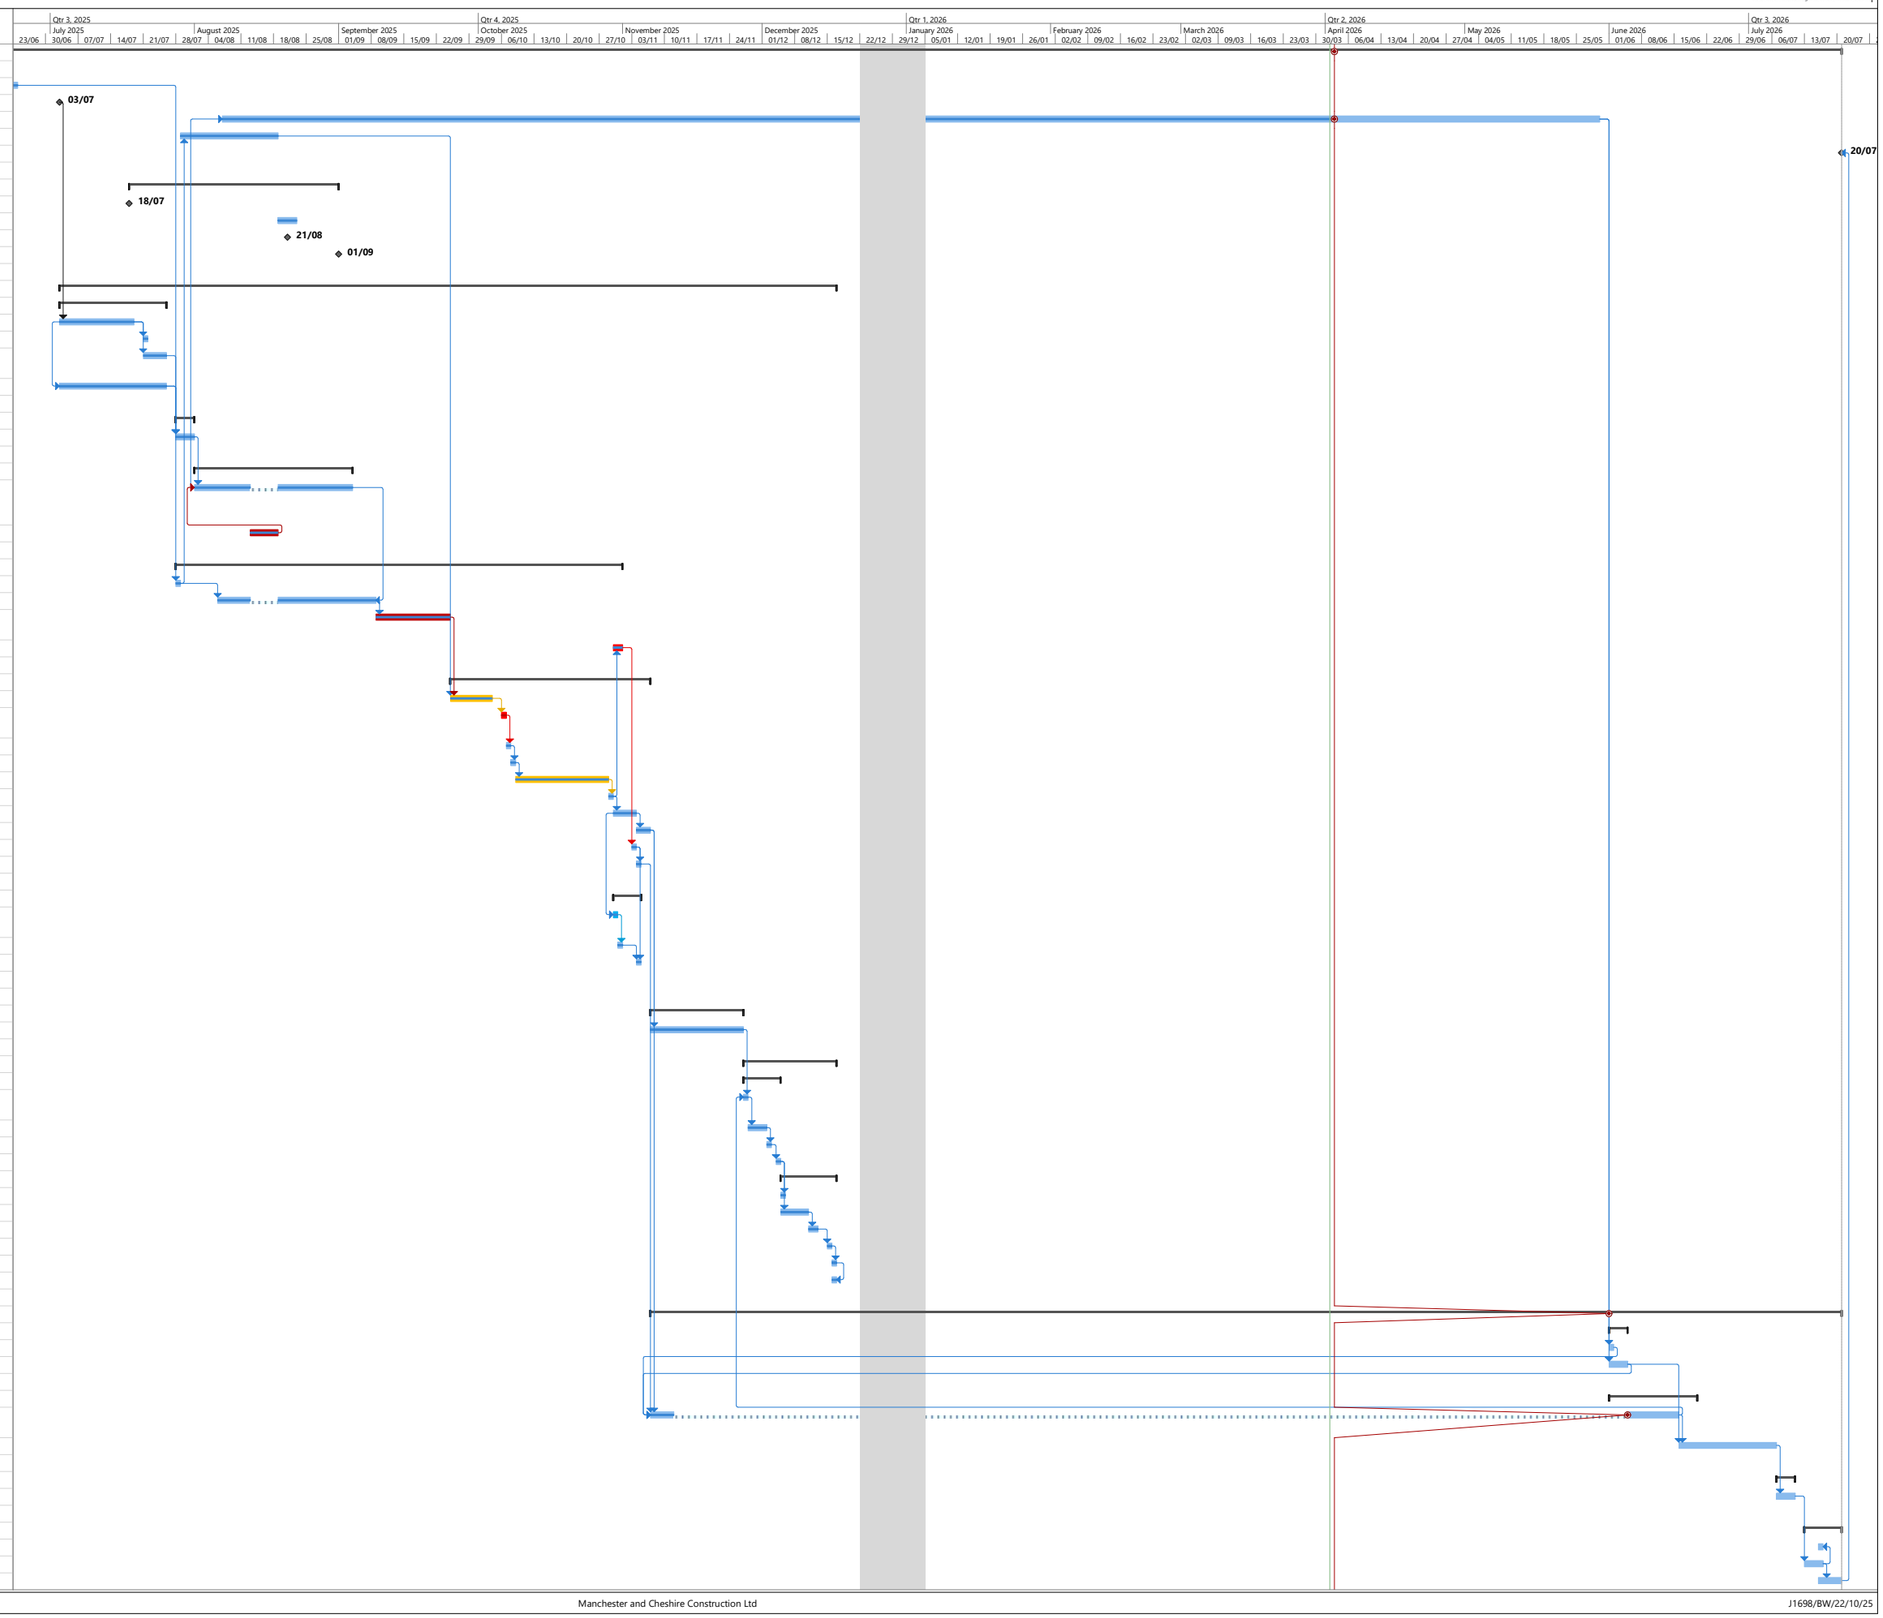ID	Task Name	% Complete	Duration	Start	Finish	% Complete
1	**UoM - Whitworth Retaining Wall**	**79%**	**280 days**	**Tue 10/06/25**	**Mon 20/07/26**	**79%**
2						
3	Temp Works Design Period	100%	10 days	Tue 10/06/25	Mon 23/06/25	100%
4	Start on Site	100%	0 days	Thu 03/07/25	Thu 03/07/25	100%
5	Procurement of extra materials	80%	202 days	Thu 07/08/25	Fri 29/05/26	80%
6	Cut and bent lead in	100%	15 days	Tue 29/07/25	Mon 18/08/25	100%
7	Handover	0%	0 days	Mon 20/07/26	Mon 20/07/26	0%
8						
9	**Key School Dates**	**100%**	**31 days**	**Fri 18/07/25**	**Mon 01/09/25**	**100%**
10	School Closes	100%	0 days	Fri 18/07/25	Fri 18/07/25	100%
11	Summer School 10:00 - 14:00	100%	4 days	Tue 19/08/25	Fri 22/08/25	100%
12	GCSE Results	100%	0 days	Thu 21/08/25	Thu 21/08/25	100%
13	School Reopens	100%	0 days	Mon 01/09/25	Mon 01/09/25	100%
14						
15	**Phase 1**	**100%**	**119 days**	**Thu 03/07/25**	**Tue 16/12/25**	**100%**
16	**Site Setup Ph 1**	**100%**	**17 days**	**Thu 03/07/25**	**Fri 25/07/25**	**100%**
17	Form haul road and compound area	100%	12 days	Thu 03/07/25	Fri 18/07/25	100%
18	Cabin delivery	100%	1 day	Mon 21/07/25	Mon 21/07/25	100%
19	Form L shaped access to work area with cullular protection	100%	5 days	Mon 21/07/25	Fri 25/07/25	100%
20	Protect existing trees	100%	17 days	Thu 03/07/25	Fri 25/07/25	100%
21						
22	**Temp Works**	**100%**	**4 days**	**Mon 28/07/25**	**Thu 31/07/25**	**100%**
23	Install wall supports/scaffolding	100%	4 days	Mon 28/07/25	Thu 31/07/25	100%
24						
25	**Demolition**	**100%**	**24 days**	**Fri 01/08/25**	**Wed 03/09/25**	**100%**
26	Carefully take down brickwork walls inc copings plinth bricks and piers; clean down and set aside for reuse	100%	20 days	Fri 01/08/25	Wed 03/09/25	100%
27	Delay Asbestos Sampling	100%	4 days	Wed 13/08/25	Mon 18/08/25	100%
28						
29	**Excavating**	**100%**	**70 days**	**Mon 28/07/25**	**Fri 31/10/25**	**100%**
30	Trial holes beside the retaining wall	100%	1 day	Mon 28/07/25	Mon 28/07/25	100%
31	Beside the retaining wall (ex vac)	100%	20 days	Wed 06/08/25	Mon 08/09/25	100%
32	Additional time taken excavating due to Vac Ex and Bartletts involvement	100%	12 days	Tue 09/09/25	Wed 24/09/25	100%
33	Buttress Foundation	100%	2 days	Thu 30/10/25	Fri 31/10/25	100%
34						
35	**Formwork and Reinforcement**	**100%**	**31 days**	**Thu 25/09/25**	**Thu 06/11/25**	**100%**
36	Foundations (dig, blind, cut and bent)	100%	7 days	Thu 25/09/25	Fri 03/10/25	100%
37	Additional time taken due to Vac Ex involvement	100%	1 day	Mon 06/10/25	Mon 06/10/25	100%
38	Pour Concrete	100%	1 day	Tue 07/10/25	Tue 07/10/25	100%
39	Curing	100%	1 day	Wed 08/10/25	Wed 08/10/25	100%
40	Walls (formwork, cut and bent)	100%	14 days	Thu 09/10/25	Tue 28/10/25	100%
41	Pour Concrete	100%	1 day	Wed 29/10/25	Wed 29/10/25	100%
42	Curing (subject to cube test)	100%	3 days	Thu 30/10/25	Mon 03/11/25	100%
43	Strike Formwork	100%	3 days	Tue 04/11/25	Thu 06/11/25	100%
44	Concrete buttress foundations	100%	1 day	Mon 03/11/25	Mon 03/11/25	100%
45	Curing	100%	1 day	Tue 04/11/25	Tue 04/11/25	100%
46						
47	**Drainage**	**100%**	**4 days**	**Thu 30/10/25**	**Tue 04/11/25**	**100%**
48	Break out existing vitrified clay gulley and backfill	100%	1 day	Thu 30/10/25	Thu 30/10/25	100%
49	Install new drainage, gulley and backfill	100%	1 day	Fri 31/10/25	Fri 31/10/25	100%
50	Test on completion	100%	1 day	Tue 04/11/25	Tue 04/11/25	100%
51						
52						
53	**Filling to make up levels**	**100%**	**14 days**	**Fri 07/11/25**	**Wed 26/11/25**	**100%**
54	Stoning Up	100%	14 days	Fri 07/11/25	Wed 26/11/25	100%
55						
56	**Decant Site Ph 1**	**100%**	**14 days**	**Thu 27/11/25**	**Tue 16/12/25**	**100%**
57	**L shaped access**	**100%**	**6 days**	**Thu 27/11/25**	**Thu 04/12/25**	**100%**
58	Remove stone from cellular protection system	100%	1 day	Thu 27/11/25	Thu 27/11/25	100%
59	Topsoil	100%	2 days	Fri 28/11/25	Mon 01/12/25	100%
60	Cultivating	100%	1 day	Tue 02/12/25	Tue 02/12/25	100%
61	Remove HERAS and cabins	100%	1 day	Thu 04/12/25	Thu 04/12/25	100%
62	**Haul Rd**	**100%**	**8 days**	**Fri 05/12/25**	**Tue 16/12/25**	**100%**
63	Deliver Cabin	100%	1 day	Fri 05/12/25	Fri 05/12/25	100%
64	Remove stone haul rd	100%	4 days	Fri 05/12/25	Wed 10/12/25	100%
65	Topsoil	100%	2 days	Thu 11/12/25	Fri 12/12/25	100%
66	Cultivating	100%	1 day	Mon 15/12/25	Mon 15/12/25	100%
67	Remove HERAS	100%	1 day	Tue 16/12/25	Tue 16/12/25	100%
68	Remove Cabin and Mats	100%	1 day	Tue 16/12/25	Tue 16/12/25	100%
69						
70	**Phase 2**	**6%**	**172 days**	**Fri 07/11/25**	**Mon 20/07/26**	**6%**
71	**Site Setup Ph 2**	**0%**	**4 days**	**Mon 01/06/26**	**Thu 04/06/26**	**0%**
72	Cabin Delivery	0%	1 day	Mon 01/06/26	Mon 01/06/26	0%
73	Lay floor mats	0%	4 days	Mon 01/06/26	Thu 04/06/26	0%
74						
75	**Phase 2 Bricklaying**	**0%**	**15 days**	**Mon 01/06/26**	**Fri 19/06/26**	**0%**
79	Rebuild brickwork walls and buttresses (7 days from PH1)	35%	10 days	Fri 07/11/25	Mon 15/06/26	35%
80	Rebuild piers and terracotta elements	0%	15 days	Tue 16/06/26	Mon 06/07/26	0%
81						
82	**Balustraids**	**0%**	**4 days**	**Tue 07/07/26**	**Fri 10/07/26**	**0%**
83	Reinstall, touch up and decorate stair handrails	0%	4 days	Tue 07/07/26	Fri 10/07/26	0%
84						
85	**Decant Phase 2**	**0%**	**6 days**	**Mon 13/07/26**	**Mon 20/07/26**	**0%**
86	Remove cabin	0%	1 day	Thu 16/07/26	Thu 16/07/26	0%
87	Remove floor mats	0%	4 days	Mon 13/07/26	Thu 16/07/26	0%
88	Turf	0%	3 days	Thu 16/07/26	Mon 20/07/26	0%
