
Wythenshawe Project

26/06/2026

Line	Name	Duration	Start	Finish	Percent complete	Planned percent complete from baseline
1	Contract Information	8w 4d	27/04/2026	29/06/2026	97.76	
2	UKPN Works For Park	30w	27/05/2026	07/01/2027	4.22	
3	UKPN Works For Sports Ground	47w	27/05/2026	10/05/2027	2.45	
4	Temporary Car park	9w 3d	26/06/2026	02/09/2026		
5	Wythenshawe Sports Ground	38w 3d	05/05/2026	15/02/2027	13.64	
6	Wythenshawe Park	79w	20/04/2026	17/11/2027	4.23	1.53
7	PLANNING CONDITIONS	31w 1d	20/04/2026	26/11/2026	11.60	4.50
8	PRE COMMENCEMENT PLANNING CONDITIONS	27w 1d	20/04/2026	29/10/2026	15.82	6.14
9	PRE ABOVE DPC CONDITIONS	17w 2d	28/07/2026	26/11/2026		
10	Bat works	26w	26/06/2026	08/01/2027		
11	Wythenshawe Park Construction Period	49w 4d	13/11/2026	17/11/2027		
12	Site Establishment	3w 1d	13/11/2026	04/12/2026		
13	Demolition	7w 4d	13/11/2026	20/01/2027		
14	Enabling Works site move	4w 4d	18/12/2026	03/02/2027		
15	Foundations	12w	04/02/2027	30/04/2027		
16	Below Ground blockwork	5w 4d	26/03/2027	10/05/2027		
17	Below Ground Drainage	5w 4d	02/04/2027	17/05/2027		
18	Blinding	5w 1d	09/04/2027	19/05/2027		
19	Floor insulation	6w	13/04/2027	27/05/2027		
20	Forming of slab	6w	20/04/2027	02/06/2027		
21	Pre Pour inspections	5w 3d	23/04/2027	03/06/2027		
22	Building control inspections	5w 3d	26/04/2027	04/06/2027		
23	Concrete Works	5w 4d	27/04/2027	08/06/2027		
24	Steel Frame	6w 4d	29/04/2027	17/06/2027		
25	Scaffolding	4w 2d	21/05/2027	22/06/2027		
26	Parapit SFS works	3w 1d	26/05/2027	17/06/2027		
27	Roof Deck	4w 1d	02/06/2027	30/06/2027		
28	Roofing	4w 2d	09/06/2027	08/07/2027		
29	Roof plant and screening	4w	09/07/2027	05/08/2027		
30	SFS	4w	26/05/2027	23/06/2027		
31	Glazing	3w 3d	03/06/2027	28/06/2027		
32	Masonary	8w	08/06/2027	02/08/2027		
33	Partitions 1st fix	4w	08/06/2027	05/07/2027		
34	1st fix HRU's	4w 2d	11/06/2027	12/07/2027		
35	Containment	4w	18/06/2027	15/07/2027		
36	1st fix plumbing	4w 2d	23/06/2027	22/07/2027		
37	1st fix electrical	4w 2d	23/06/2027	22/07/2027		
38	1st fix fire and data	4w 2d	29/06/2027	28/07/2027		
39	Fire stopping	4w 2d	02/07/2027	02/08/2027		
40	Hold point inspection	4w	07/07/2027	03/08/2027		
41	Building control inspections	4w	08/07/2027	04/08/2027		
42	Sports Areas internal fitout	16w 1d	09/07/2027	01/11/2027		
43	GP Areas internal fit out	14w 4d	05/08/2027	17/11/2027		
44	Comissioning	5w	07/01/2027	10/02/2027		

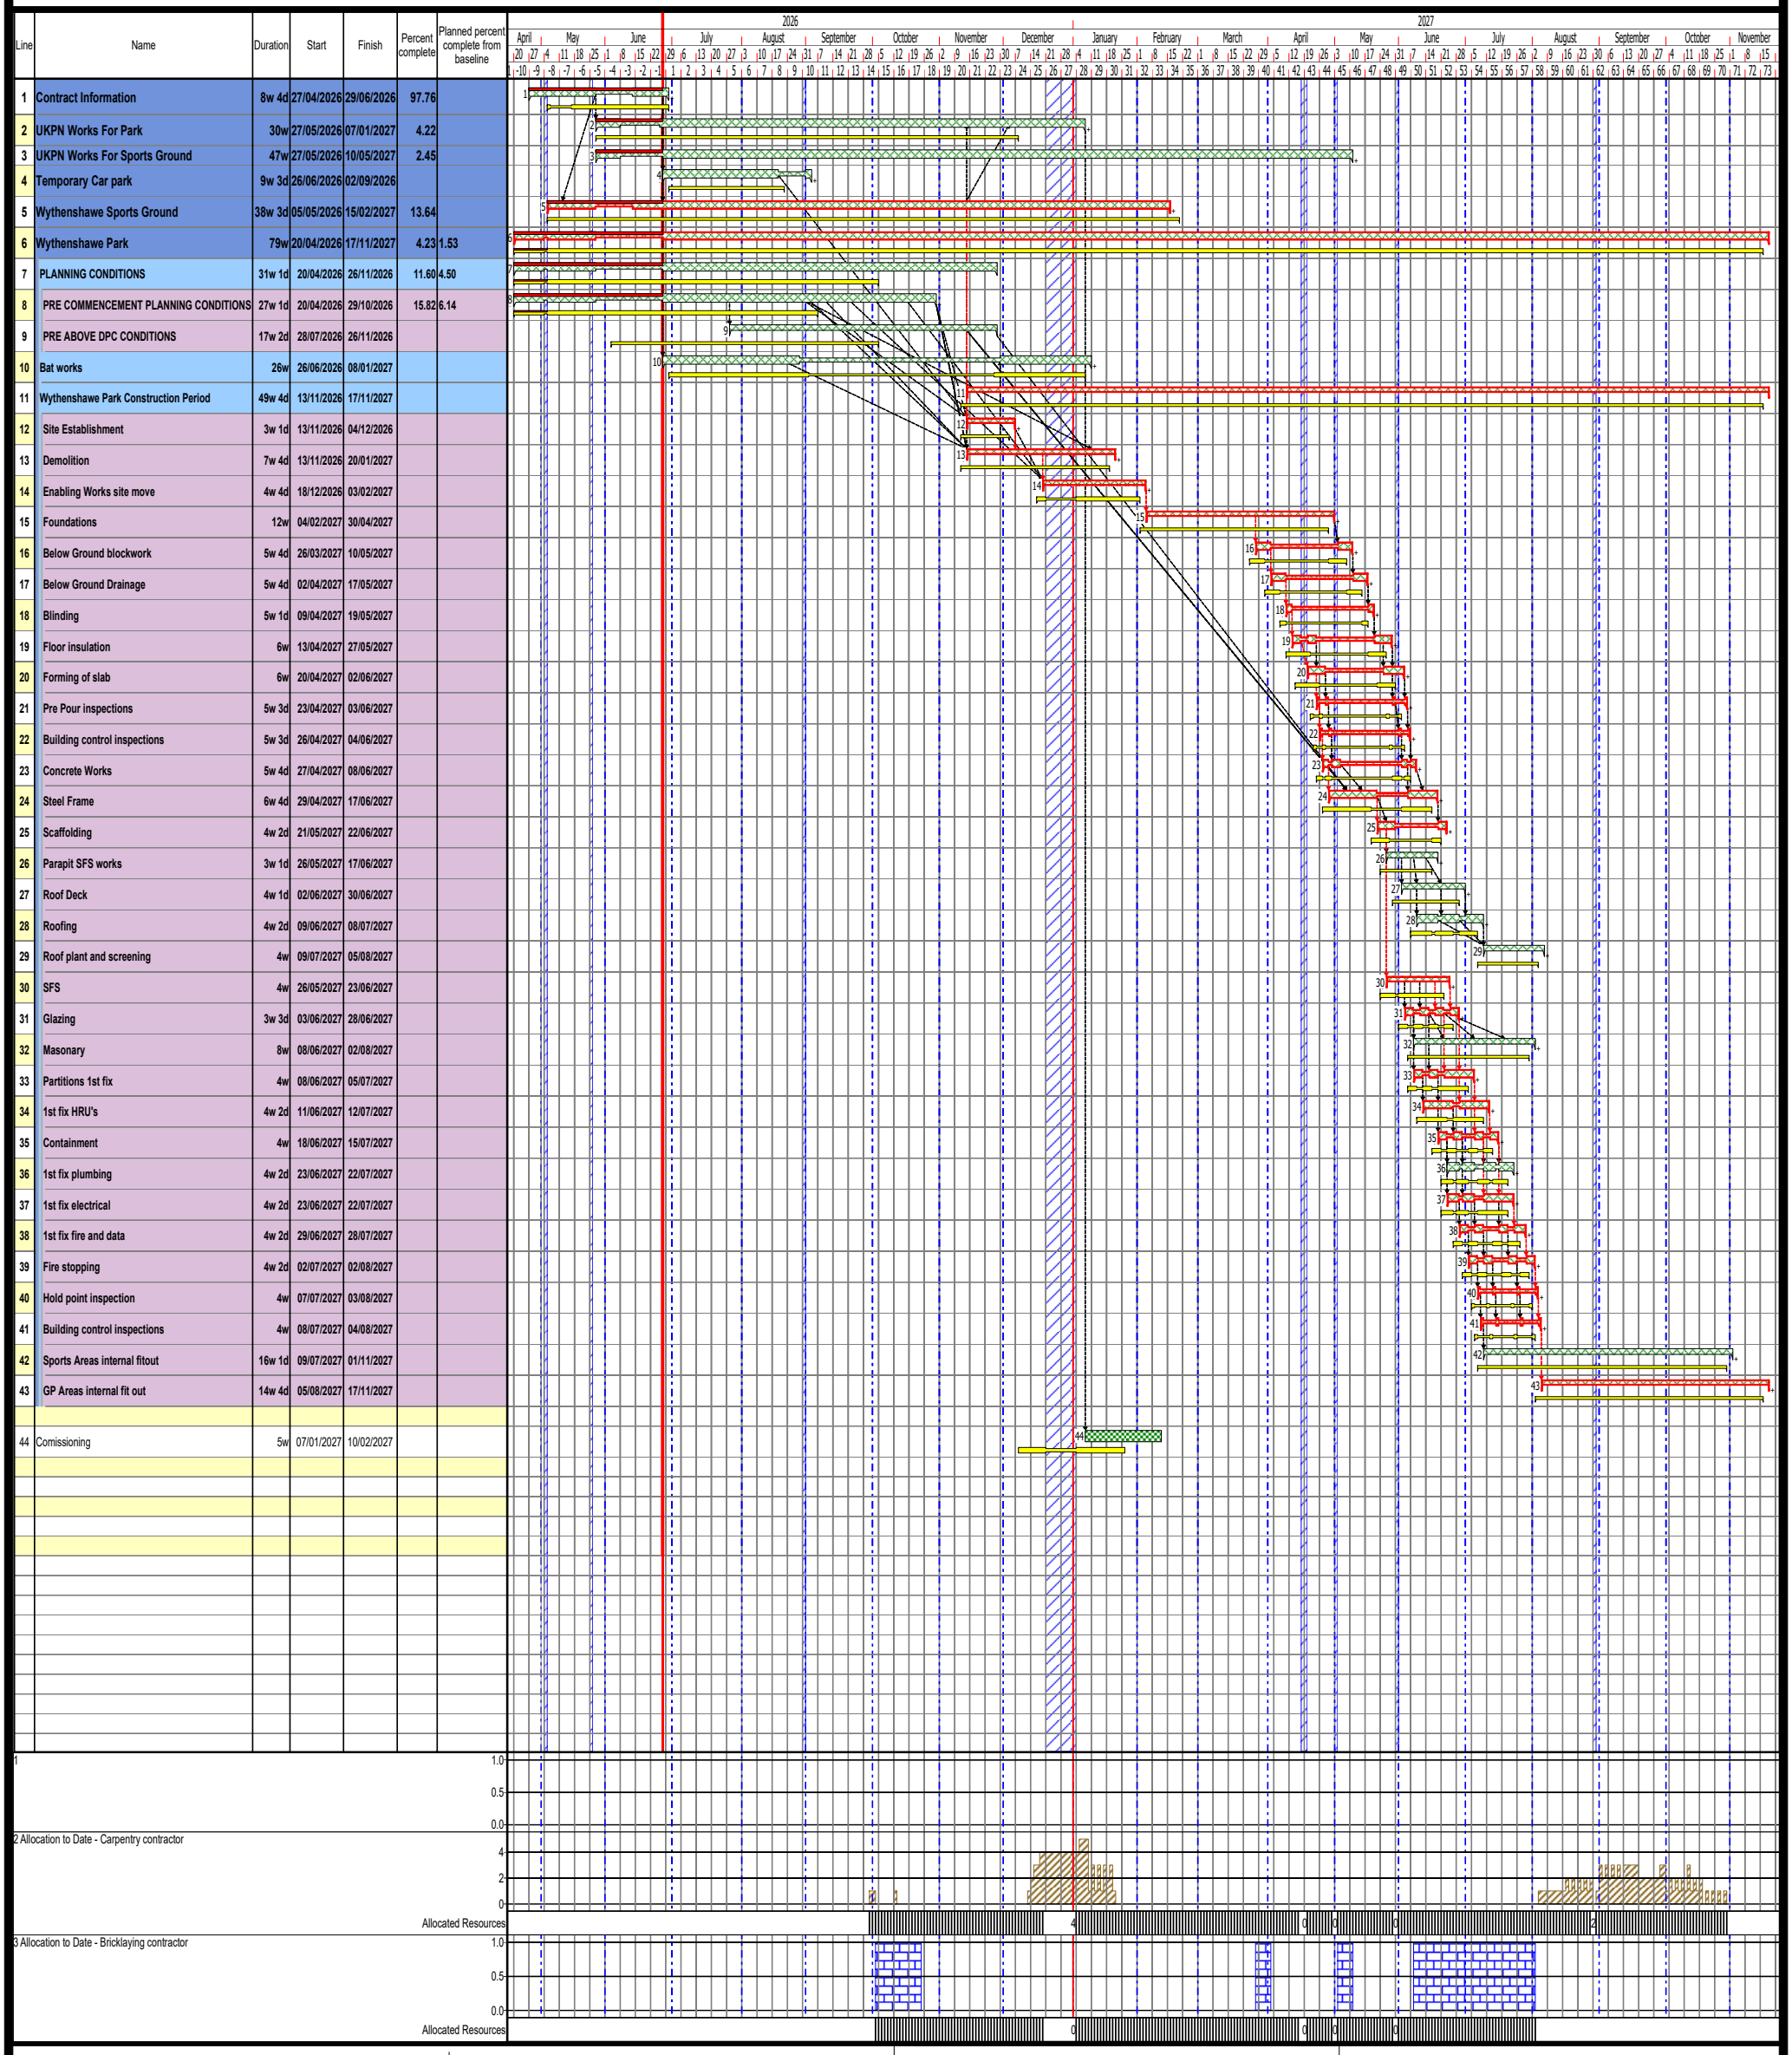

Drawn by: Contracts Manager: Lee Jones	Dwg No. HC-CO-001	Revision No. P	Notes: Comment - Provisional for approval
