
Hilton Motto, Laystall Street, Manchester

Construction Programme 09 - High Level Summary

Line	Name	Duration	Start Date	Finish Date	Planned %
1	Construction Duration	104w 4d	12/05/25	25/06/27	11.10
2	Start on Site		12/05/25	12/05/25	100.00
3	Enabling Works	1w 4d	12/05/25	22/05/25	100.00
4	Sub-Structure	34w	22/05/25	30/01/26	100.00
5	Temporary Site Services	54w 1d	09/02/26	15/03/27	18.77
6	Tower Crane (Including Erection / Dismantle)	42w 1d	09/02/26	07/12/26	27.49
7	Mast Climber	37w 3d	10/06/26	15/03/27	
8	Hoist	34w 4d	22/06/26	05/03/27	
9	RC Frame	40w 8.h	02/02/26	16/11/26	25.88
10	RC Grd & 1st Slab	2w	02/02/26	13/02/26	100.00
11	Core	33w 2.d	16/02/26	13/10/26	35.59
12	Slabs & Verticals	28w 4.75d	13/04/26	04/11/26	10.34
13	Roof Upstand / Remove Final RC Falsework	1w 3d	04/11/26	16/11/26	
14	Roof Finishes	3w	16/11/26	07/12/26	
15	SFS / Weatherboard / Windows	21w 4d	15/06/26	13/11/26	
16	SFS / Weatherboard / Windows 2nd - 10th Floor	8w	15/06/26	07/08/26	
17	SFS / Weatherboard/ Windows 11th - Roof	10w	07/09/26	13/11/26	
18	SFS / Weatherboard/ Windows Grd - 2nd	1w	16/11/26	20/11/26	
19	External Cladding / Windows	30w	06/07/26	15/02/27	
20	External Cladding 2nd - 10th Floor	12w 1d	06/07/26	29/09/26	
21	External Cladding 11th - Roof	14w	30/09/26	19/01/27	
22	External Cladding Ground - 2nd Floor	3w 4d	20/01/27	15/02/27	
23	Internal Floors Fit Out	38w 4d	06/07/26	20/04/27	
24	Floors Fit out (2nd -19th)	26w 4d	06/07/26	22/01/27	
25	Stairs Fit Out	19w	21/09/26	12/02/27	
26	Non- Residential Floor (Grd- Mezzanine) Fit Out	21w	09/11/26	20/04/27	
27	Hoist Rooms; Close Cladding / Fit Out	17w	23/11/26	02/04/27	
28	Lift Installations / Lifts Test & Commission	20w	16/11/26	21/04/27	
29	Utilities & Incoming Services	10w	07/12/26	01/03/27	
30	FF&E / Test & Comm / Final Clean	12w 1d	08/03/27	04/06/27	
31	External Landscape incl Planning / Approval	21w 1d	25/01/27	25/06/27	
32	Planning & Approvals	15w 2d	25/01/27	14/05/27	
33	External Works	5w 4d	17/05/27	25/06/27	
34	Project Completion		28/06/27	28/06/27	

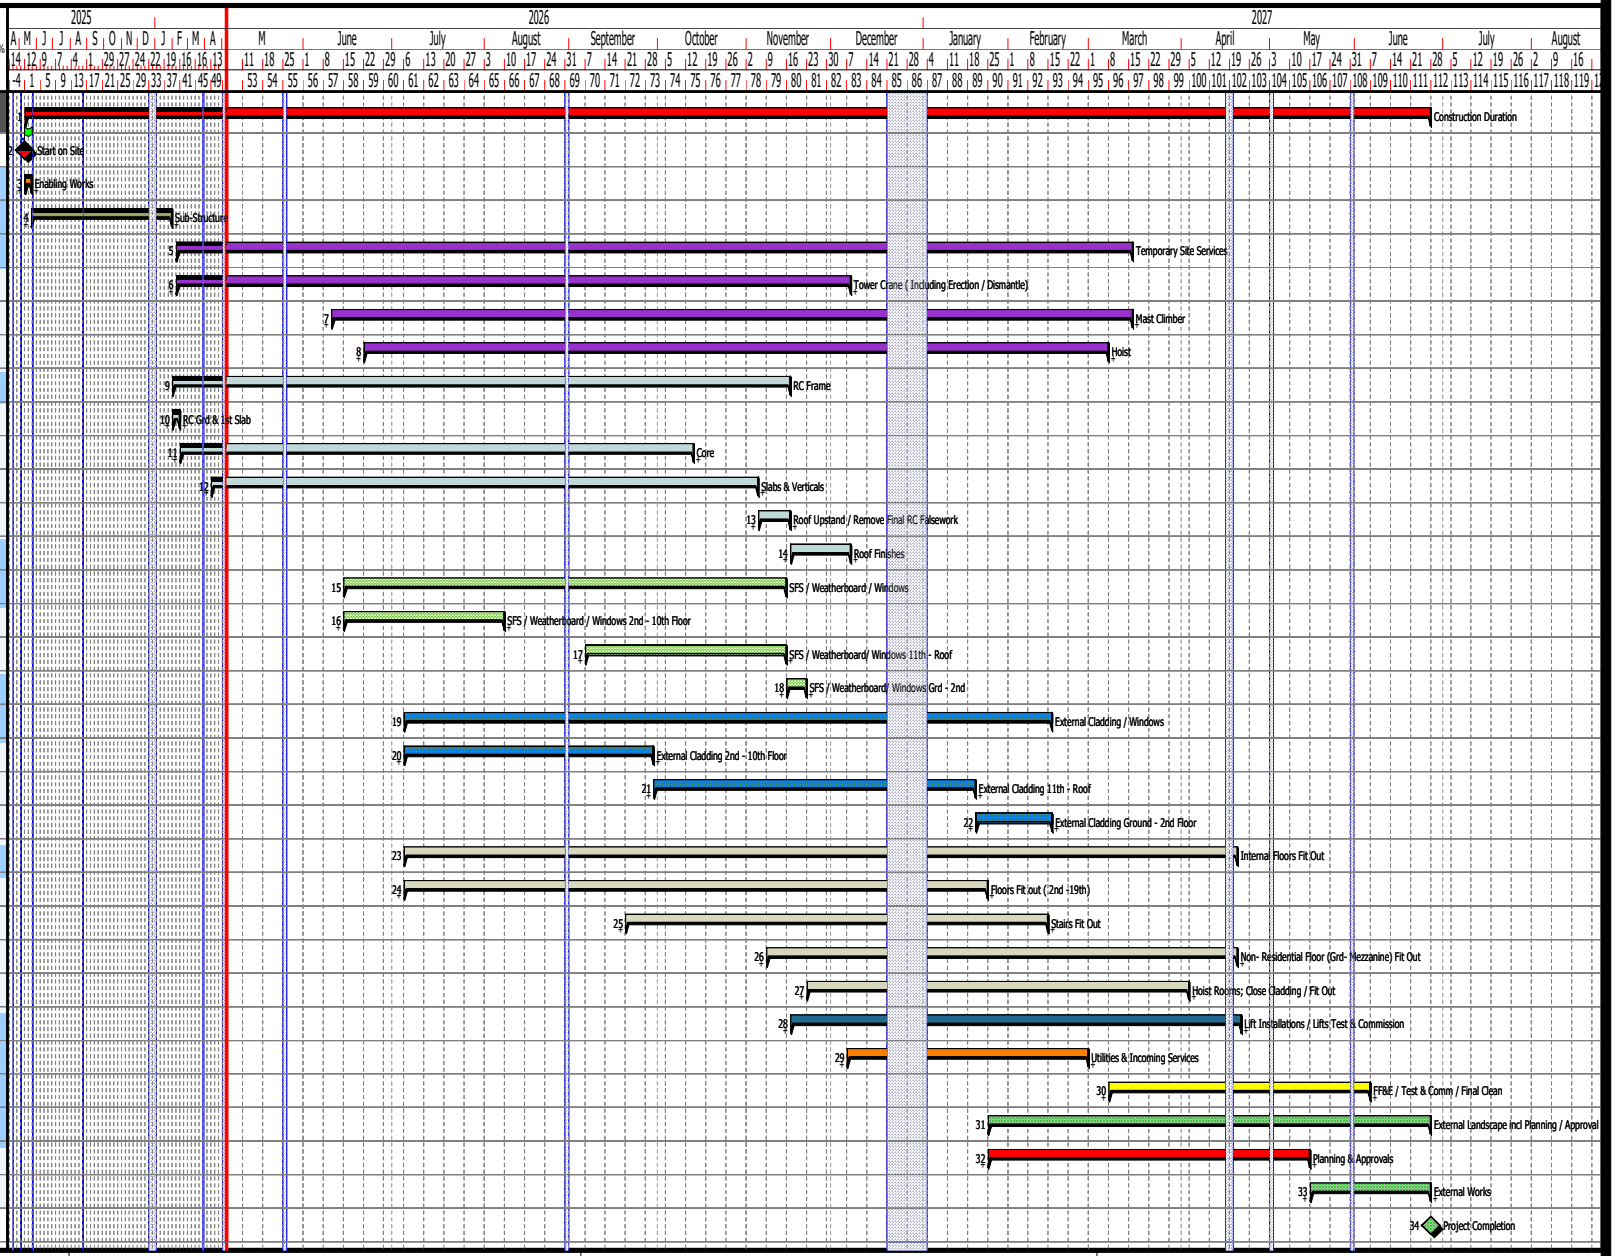

Drawn by: Warren Alani | Dwg No. CMS-HM_LS-PON-D09 | Revision No. | Notes:

Generated by WA Planning Ltd
